

Travail en équipe

SAÉ S2.06

Travail en équipe



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



IUT Saint-Dié-des-Vosges

Établissement/Formation

IUT de Saint-Dié-des-Vosges - Première Année
BUT Informatique

Réalisé par:

Antoine Barthélémy, Lucas Cesar, Robin Biget


Superviseur:

Boris Davin

Sommaire

Contents

Introduction	3
Répartition des tâches et planning :	3
Planning prévisionnel vs constaté :	4
Analyse de l'organisation	5
Points forts de notre organisation	5
Points faibles et difficultés rencontrées.....	6
Ce que nous changerions si c'était à refaire.....	6
Capitalisation d'expérience	6
Savoir-faire acquis :	6
Savoir-être développés :	7
Ce que nous retiendrons pour nos futurs projets :	7
Conclusion.....	7

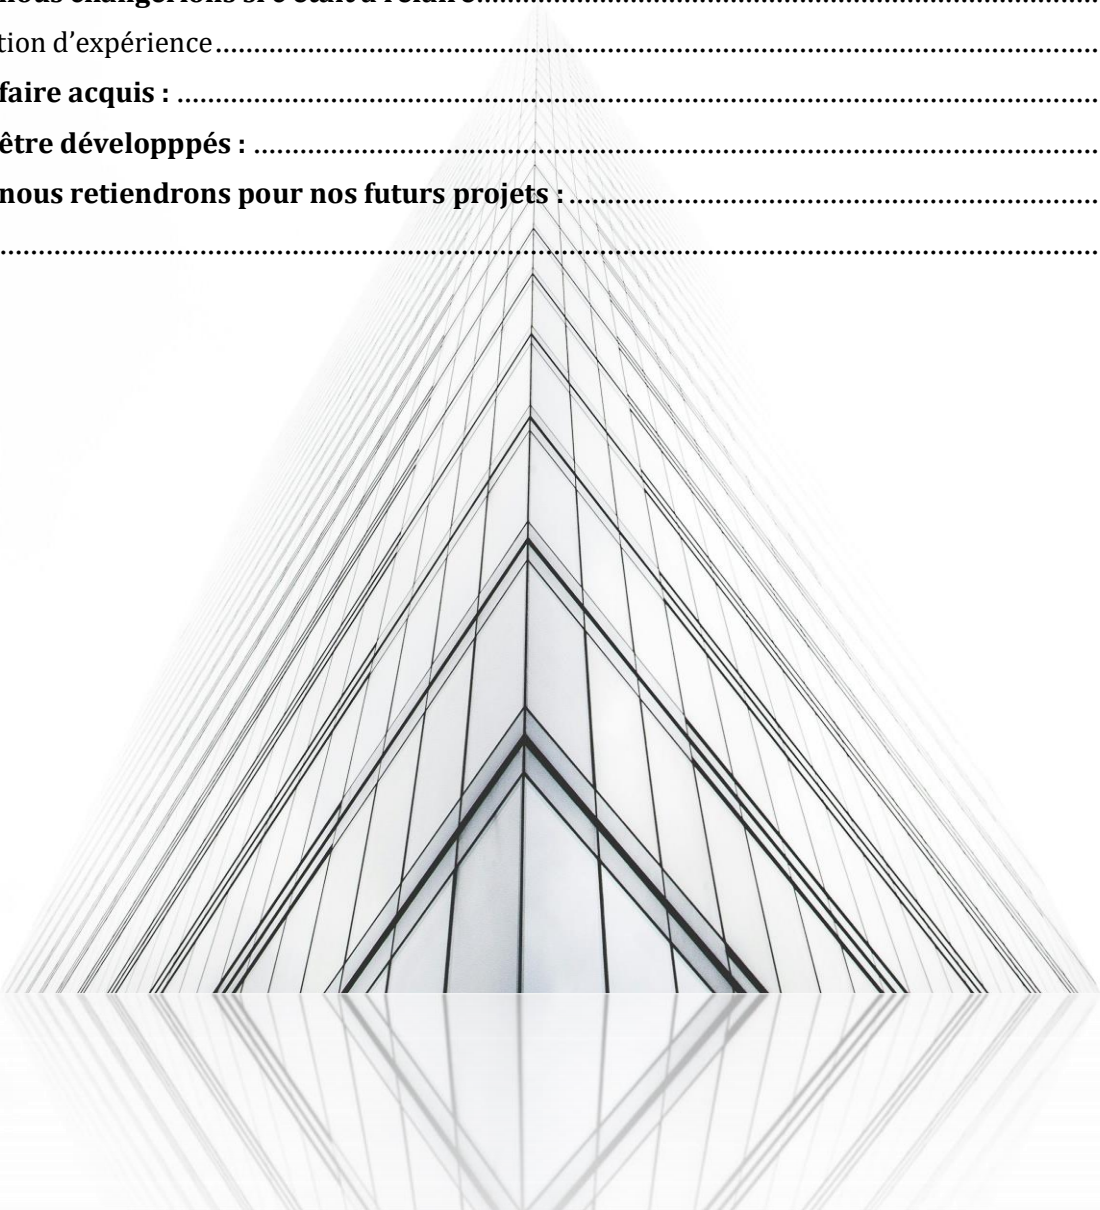

Introduction

La SAÉ 2.05 avait pour objectif de concevoir une idée originale de développement informatique. Nous avons choisi de travailler sur CultureJam, un réseau social inspiré du concept de BeReal, mais entièrement dédié à la culture. Il vise à encourager le partage spontané et authentique de découvertes culturelles : livres, films, musiques, expositions, ou toute autre forme d'expression artistique.

Pour cette SAÉ, nous avons travaillé en groupe de trois : Antoine Barthélémy, Lucas Cesar et Robin Biget. Les rôles étaient polyvalents, et répartis en fonction des exigences à respecter (étude de la demande, rédaction du cahier des charges, etc.) Ainsi que des dates butoirs fixées tout au long du projet.

Le présent document propose un retour structuré sur le fonctionnement de l'équipe et l'organisation du travail tout au long de cette SAÉ.

Répartition des tâches et planning :

TÂCHE PRINCIPALE	PERSONNE(S) EN CHARGE	COMMENTAIRE
ÉTUDE DE LA DEMANDE	Lucas, Antoine, Robin	Travail collectif pour comprendre les besoins des utilisateurs potentiels.
ÉTUDE DE LA CONCURRENCE	Lucas, Antoine, Robin	Analyse conjointe de projets similaires afin d'identifier les points différenciants.
BENCHMARKING EXTERNE	Antoine	Antoine a analysé en détail plusieurs applications pour enrichir notre réflexion.
ÉTUDE ENVIRONNEMENT	Lucas, Antoine	Étude des facteurs sociaux, techniques et économiques impactant le projet.
GUIDE D'ENTRETIEN	Lucas, Antoine, Robin	Création d'un guide structuré pour mener les interviews avec cohérence.
WBS	Robin	Robin a décomposé le projet en sous-tâches pour mieux répartir le travail.

CAHIER DES CHARGES	Lucas, Antoine	Rédaction du cahier en tenant compte des besoins fonctionnels et non fonctionnels.
INTERVIEWS	Antoine, Robin, Lucas	Réalisation sur le terrain avec un bon équilibre entre les membres.
MAQUETTE	Antoine	Proposition d'un design fonctionnel et esthétique, réalisée sous Figma.
PRÉPARATION ORALE	Antoine, Robin, Lucas	Répétitions, répartition de la parole et ajustements collectifs.
PITCH ORAL	Antoine, Robin, Lucas	Présentation finale à trois voix, avec une bonne dynamique de groupe.

Planning prévisionnel vs constaté :

La colonne « DATE » illustre notre planning prévisionnel. Ces « deadlines » ont été proposées dans le PDF « Gestion de projet - Cadrage, progression 2025 » comme repère dans l'avancement de notre projet. Même si nos tâches n'ont pas été réalisées exactement à la date inscrite sur ce PDF, ce plan nous a permis de nous organiser convenablement.

DATE	TÂCHE PRÉVUE	RÉALISÉE QUAND	ÉCART/COMMENTAIRES
DU 11/03 AU 13/03	Étude de la demande	13 Mars	Pas de retard.
DU 11/03 AU 13/03	Étude de la concurrence	13 Mars	Pas de retard.
DU 12/03 AU 13/03	Benchmarking externe	13 Mars	Pas de retard.
DU 14/03 AU 17/03	Étude environnement	17 Mars	Nous avons légèrement tardé sur « l'Environnement technologique et juridique » du fait que nous voulions, dans un premier temps, terminer les gros travaux.
DU 18/03 AU 18/03	Guide d'entretien	18 Mars	Pas de retard.

DU 18/03 AU 18/03	WBS	18 Mars	Pas de retard.
DU 18/03 AU 22/03	Cahier des charges	22 Mars	Le cahier des charges comportait une partie dépendante d'un autre livrable, ce qui a entraîné un léger retard dans sa finalisation.
DU 19/03 AU 24/03	Interviews	24 Mars	Les interviews n'ont pas pu être réalisées plus tôt en raison des mauvaises conditions météorologiques.
DU 25/03 AU 31/03	Maquette	31 Mars	Pas de retard.
DU 25/03 AU 31/03	Préparation Orale	31 Mars	Pas de retard.
1 ^{ER} AVRIL	Pitch Oral	1 ^{er} Avril	Date fixée par notre professeur.

Analyse de l'organisation

Outil d'analyse : CQQCOQP (Qui? Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Combien ?)

Élément	Analyse
Qui ?	3 membres répartis selon les compétences : rédaction, analyse, design
Quoi ?	Conception d'un réseau social culturel, documents de cadrage, maquette
Quand ?	Projet réalisé entre fin février et début avril 2025
Comment ?	Discord pour communiquer, Trello pour suivre le planning, Freemind pour la carte mentale.
Où ?	Principalement à distance + séances de projet à l'IUT
Pourquoi ?	Répondre à la problématique d'accès à la culture pour les jeunes
Combien ?	Estimation d'environ 10 à 15 heures de travail par personne

Points forts de notre organisation

L'un des grands atouts de notre équipe a été la **communication fluide** entre les membres. Nous avons mis en place très tôt un **groupe Discord**, qui a servi de canal principal pour échanger, répartir les tâches, organiser des réunions et suivre l'avancement. Chaque membre était autonome sur ses missions, tout en **restant disponible pour aider les autres**. Cela a fortement contribué à une bonne ambiance de travail.

De plus, nous avons su faire preuve de réactivité : lorsque certains blocages apparaissaient (défaut de compréhension, besoin d'un document), une réunion rapide ou une prise d'initiative permettait de débloquer la situation. Enfin, notre capacité à **tenir les délais sur les grandes étapes** (cahier des charges, analyse, maquette) a été un vrai point positif.

Points faibles et difficultés rencontrées

Malgré cette organisation globalement efficace, nous avons rencontré **plusieurs points de tension** :

Certains **retards de production** ont été causés par des incompréhensions sur les attentes de certains livrables.

Il y a eu parfois un déséquilibre dans la charge de travail, certains membres ayant davantage contribué à l'analyse ou à la rédaction, tandis que d'autres étaient plus passifs sur certaines phases.

- Le **planning initial** n'a pas toujours été suivi à la lettre : certaines tâches ont été reportées faute de temps ou de validation.

Nous avons aussi utilisé un **outil de suivi clair** comme Trello assez tardivement, malheureusement, mais une fois que cet outil a été mis en place, toutes les tâches étaient faites dans l'ordre et sans problème. Les tâches étaient réparties oralement ou via Discord, ce qui est pratique mais peut manquer de rigueur lorsqu'il faut faire un bilan.

Ce que nous changerions si c'était à refaire

- Nous mettrions en place **dès le début** un tableau de suivi partagé (type Trello ou Google Sheets) pour visualiser l'état d'avancement des tâches.
- Nous définirions plus précisément les rôles dès le début.
- Enfin, nous aurions **plus anticipé les périodes de forte charge** (évaluations d'autres matières), ce qui aurait permis de mieux répartir le travail sur les semaines disponibles.

Capitalisation d'expérience

Savoir-faire acquis :

- Gestion de projet : Définition d'objectifs clairs, planification des étapes et respect des délais.
- Outils de suivi : Utilisation d'outils tels que Trello, Notion ou Jira pour la gestion des tâches et le suivi des progrès.
- Gestion des tâches : Priorisation et organisation efficace des responsabilités au sein de l'équipe.
- Collaboration technique : Développement d'interfaces, gestion des bases de données, et optimisation des performances.
- Analyse des besoins utilisateur : Compréhension des attentes et feedback pour adapter le produit.

Savoir-être développés :

- Écoute : Capacité à prendre en compte les opinions et les idées des membres de l'équipe.
- Gestion du stress : Développement de stratégies pour rester efficace dans les moments de pression.
- Communication : Échange transparent d'informations, résolution de conflits, et mise en valeur des idées.
- Responsabilité : Engagement personnel et collectif envers les objectifs du projet.

Ce que nous retiendrons pour nos futurs projets :

- Meilleures pratiques :
 - Documenter régulièrement les avancées pour éviter des oublis.
 - Fixer des points de contrôle pour mesurer l'avancement.
 - Encourager un environnement ouvert où chacun peut proposer ses idées.
 - Valider les étapes du projet avec les utilisateurs finaux.
- Erreurs à éviter :
 - Sous-estimer l'importance de la communication au sein de l'équipe.
 - Ignorer les feedbacks des utilisateurs pendant les étapes de développement.
 - Manquer de flexibilité pour ajuster le projet en cas d'imprévus.
 - Ne pas prévoir suffisamment de temps pour tester et corriger les bugs.

Conclusion

Ce projet de création de l'application CultureJam a représenté une expérience collective enrichissante et formatrice. Grâce à une organisation structurée et des outils adaptés, nous avons su mener à bien les différentes étapes, de l'analyse des besoins à la présentation finale. Les savoir-faire acquis, tels que la gestion de projet, l'utilisation des outils de suivi ou encore l'analyse des besoins utilisateurs, témoignent de notre montée en compétences techniques et méthodologiques.

Par ailleurs, ce projet nous a permis de développer des savoir-être essentiels, notamment l'écoute active, la gestion du stress et une communication efficace au sein de l'équipe. Ces qualités ont favorisé un environnement de travail collaboratif et productif, malgré les défis rencontrés.

Enfin, cette expérience nous a offert des enseignements précieux pour nos projets futurs. En capitalisant sur les meilleures pratiques identifiées et en évitant les erreurs constatées, nous sommes désormais mieux préparés à relever les défis d'autres projets. CultureJam n'est pas seulement une application que nous avons imaginée, c'est aussi le reflet de notre capacité à collaborer, à nous adapter et à transformer une idée en réalisation concrète.
